

# Meine kleine Halle

Bilderbuch 2020

1. September bis 19. Dezember 2020



Erste Planabweichung:  
Bordsteine verhindern  
Die Zufahrt aufs Grundstück unmöglich,  
Bau Dir was...  
- 120 Waschbetonplatten gestapelt  
- 6 m<sup>3</sup> Splitt



Sand, Sand, Sand ...



Mit Minibagger  
Abwasserleitungsgräben  
und Frostschrünze  
ausheben  
(Baggern ist geil,  
konzentrationsraubend  
und laut



1% Gefälle  
bei 1,60 m Tiefe  
... Wurzeln nerven  
total ab



V4A – Ringerder  
verlegt.  
Was kost´ die Welt..



Tonnenweise Material,  
Im wahrsten Wortsinne,  
mein Transit am Anschlag



Mögen die Spiele beginnen!  
Dauerregen läßt Gräben einbrechen  
Ich muß Frostschrütze betonieren,  
Schlammschlacht ohne gleichen




Überschüssigen (leider nicht überflüssigen) Beton

Kurz & klein haun ..  
Liebevoll mit dem  
Vorschlaghammer rundgeklopft



und  
abtransportieren ...

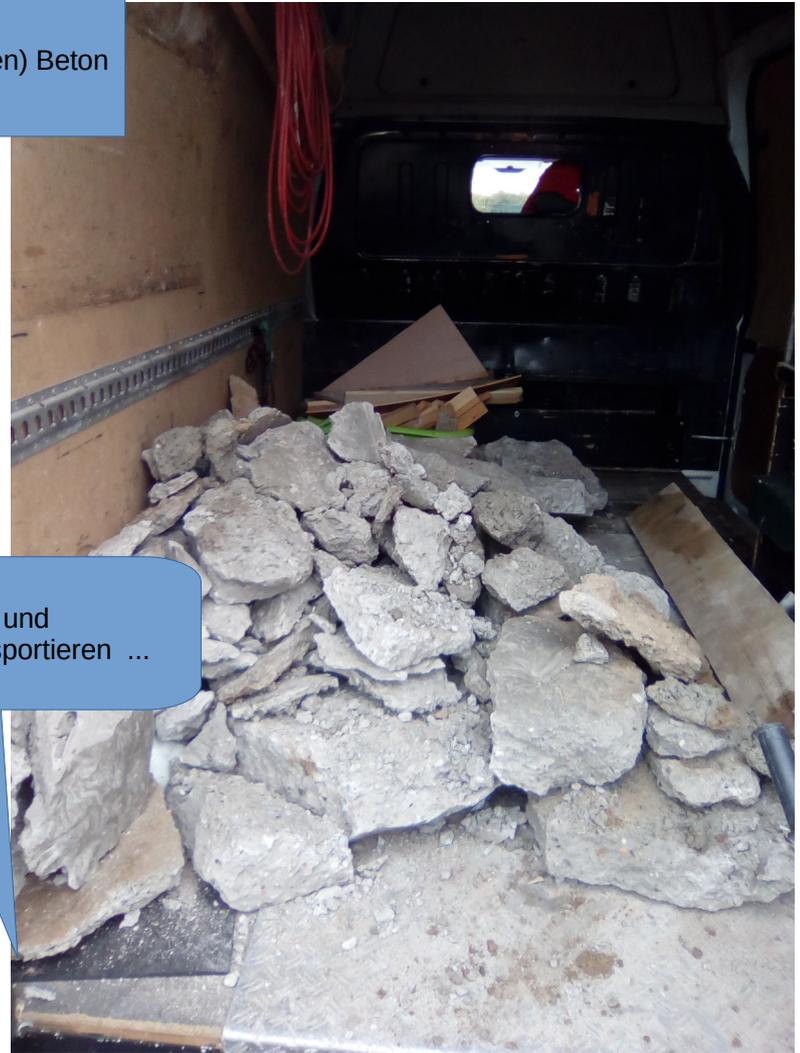




Durch gebrochene Schalung zubetoniertes Abflußrohr per Hand wieder freilegen



Canale grande (Katastropha!)  
Hauptabwasserleitung, im Dauerregen abgerutschte Gräben,  
Der Schlamm steht einem die Gummistiefel in 1,80m Tiefe aus.  
In dem Abbruch wäre ich beinahe (5cm) eingeklemmt worden.  
Das Rutschen am Ellenbogen gespürt. Nur weil am  
Freitagmittag die Abnahme wg. priv. Termin nicht  
möglich war. Am Woende Dauerregen → nicht lustig.

Testlauf Dichtigkeitsprüfung  
Druck, Wasserstand,  
Abdichtung Hauptkanalende



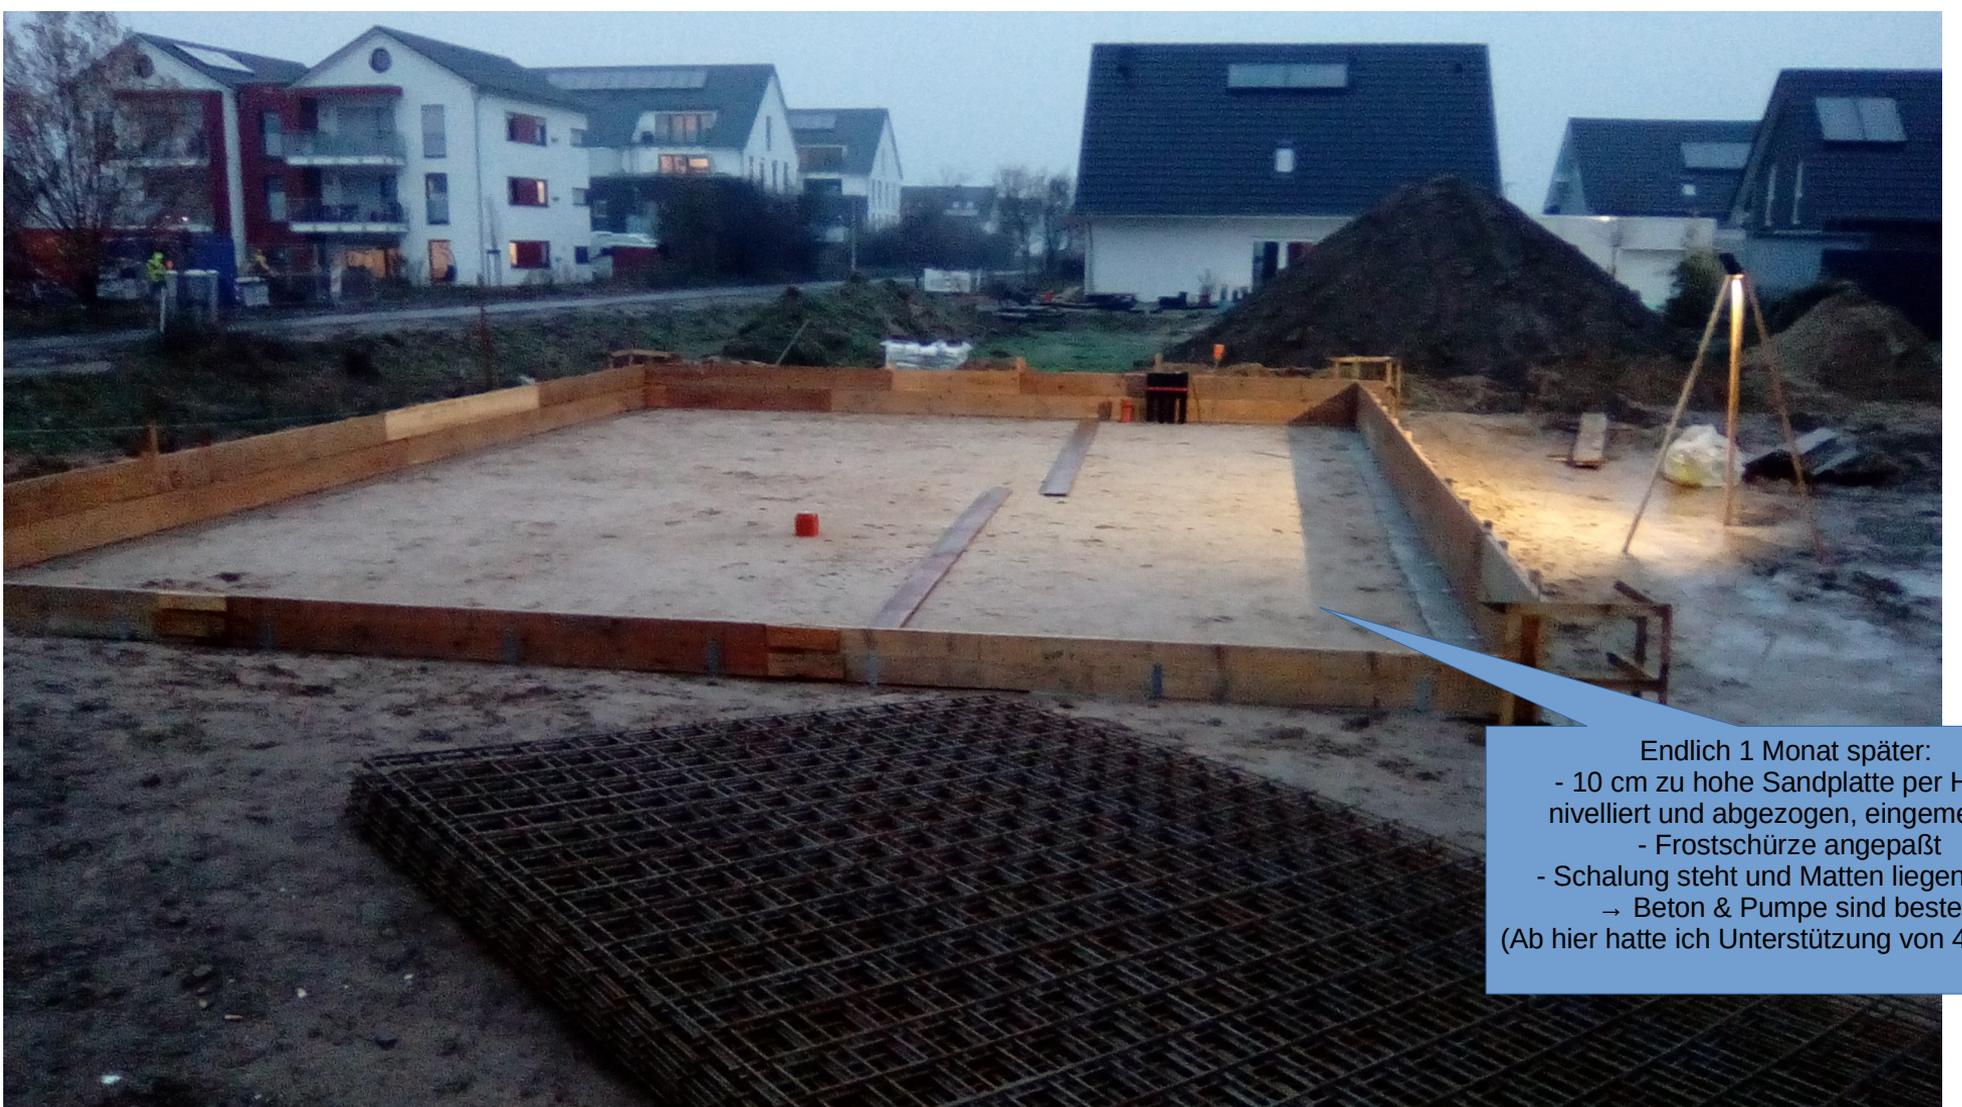

Endlich 1 Monat später:  
- 10 cm zu hohe Sandplatte per Hand nivelliert und abgezogen, eingemessen  
- Frostschräge angepaßt  
- Schalung steht und Matten liegen bereit  
→ Beton & Pumpe sind bestellt  
(Ab hier hatte ich Unterstützung von 4 Mauern)

Foto mit Emotionen pur!  
Bewehrung gelegt, Heizungsrohre vergessen, Einziehen per Hand nach 1 Tag abgebrochen,  
Am Sa 7:00 5 Mann obere Bewehrung runter, 500m Hzgrohr verlegt, 15cm Abstand, unzählige  
Schlagen durchgeflext, Rohre rein, obere Matten wieder drauf. einen Eimer Bindedraht nachgekauft,  
Am So. alleine noch einmal komplett obere Bewehrung gebunden, Montag kommt um 8:00 der Beton!!







Hintergrund: Pumpe & 3 Betonmischer,  
Mauertrupp durch mich ungestört am arbeiten ;-)  
Vordergrund Sandberg der, per Hand abgetragenen, 10cm zu hohen Sandplatte



Bodenplatte frisch betoniert, abgezogen aushärtend – wunderschön !



Hallenbau:  
Bögen lt. Krottmann per Hand  
aufstellbar  
- ging nur beim ersten Bogen  
(links wird vom Transit am Spanngurt  
gehalten)  
Doppelbögen sind nicht kippbar.  
Bögen sind echt wabbelig...

Lösung: 32to Kran  
Hektisch organisiert, ist bereits  
in 2 Stunden da !!

Vorne liegen die im Akkord zusa-  
mmengeschraubten Doppelbögen

Es fehlte ein Satz 90° Winkel,  
hektische Suche, kein Erfolg

Entscheidung: bei anderem Bogen  
wieder abschrauben und montieren  
Der Kran stand schon einsatzbereit  
und wartete...  
(120 € die angefangene Stunde,  
zzgl. 200€ An/Abfahrt)

An dem Tag brauchte keiner einen  
Kaffee zum Wachsein...  
Habe dennoch für die Mannschaft  
einen gekocht. :-)

Feierabend:  
Bögen mit erster Verstrebung stehen



14 Tage Montage  
Erstes Seitenteil, mein Kaffeeservice, gute Laune und  
Regen bei 2° Temperatur, teilweise Platten leicht festgefroren






Kleine Halle, im Vergleich zu den Häusern, schön sichtbar die Skelettrekonstruktion

- 4 Ladegeräte, 1 Wasserkocher, 2 LED Fluter, 1 Bohrhammer...
- Erste Dachplatte wird montiert



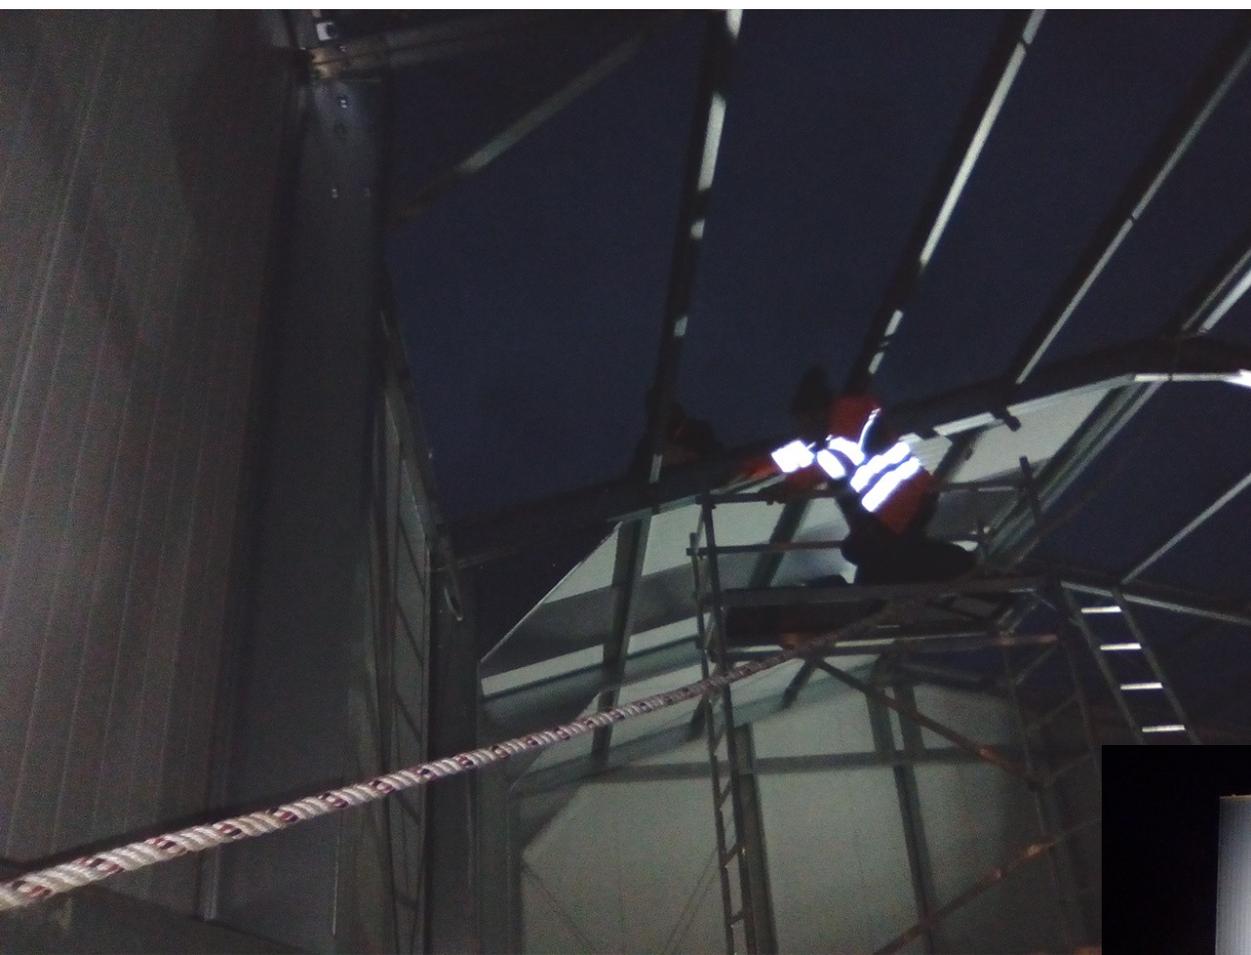

Beauties in the Night  
- Arbeiten bis spät  
- Straßenfront  
- linke Seite  
(und mein Transit – sorry C8, aber  
Rohbau wollte ich dir nicht zumuten)



Last day of thunder  
- Montage Rolltor  
- Lichtpaneele im Dach ist toll  
- Oswalds Böcke im Einsatz  
- 1cm Sandschlamm auf Boden  
→ Bierchen, grillen und ab nach Hause,  
Driving home for Christmas  
ca. 1000 km ostwärts

(Den Abwasch hatte ich dann noch un-  
freiwillig, aber effektiv gelöst...  
Ich bin beim Einladen gestolpert,  
alle meine 5 Teller sind  
auf dem Gehweg zersplittert..

